




TRAVAUX DE REHABILITAION DU CSCOM DE DIAMBACOUROU DANS LA COMMUNE RURALE DE BORONDOUGOU

RAPPORT FINAL DE REALISATION

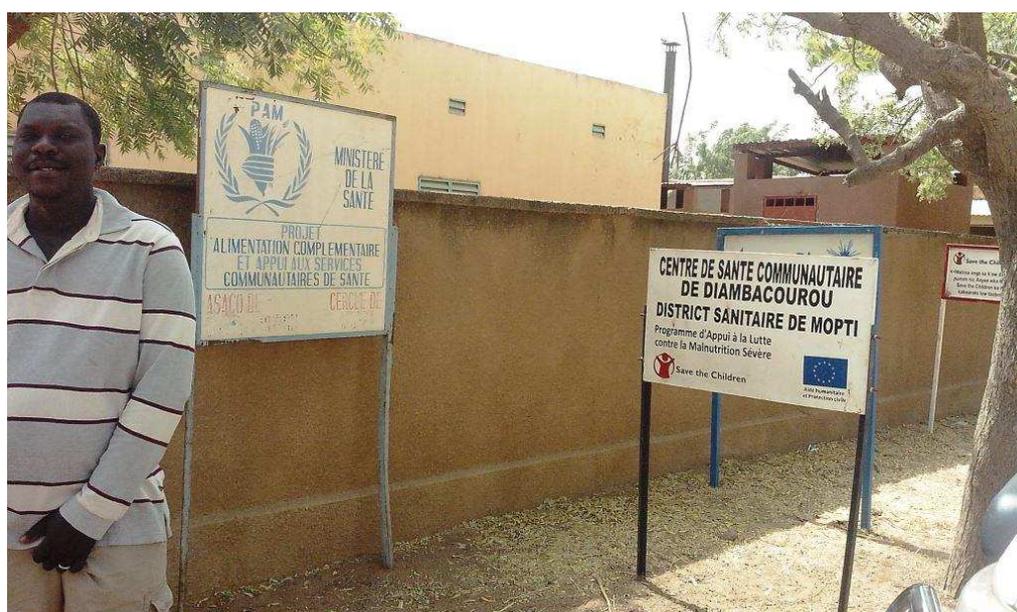

I -Introduction

Dans le cadre du renforcement des capacités en gouvernance et de la qualité des services en santé à travers son Programme d'Appui au Développement Local de Mopti (PADLM 2), l'ONG Action Mopti a entrepris les travaux de réhabilitation du CSCOM de Diambacourou.

La commune de Borondougou dispose du seul CSCOM et d'un dépôt pharmaceutique fonctionnel pour ses cinq (05) villages. Les activités menées sont la vaccination, les consultations prénatales, les consultations curatives et les accouchements. Le personnel est composé d'un (1) infirmier, d'un (1); d'une matrone et d'un gérant (1) du dépôt pharmaceutique.

II-Situation Géographique de la commune

La commune rurale de Borondougou est limitée à l'Est et au Nord par la commune de Konna, à l'Ouest et au Sud par les communes de Fatoma et Bassiro. Elle est située à 45 km au Nord de Mopti (chef lieu du cercle). La commune compte cinq (5) villages : Singo, Foussi, Bogo, Komio et le chef lieu de commune : Diambacourou. Elle s'étend sur une superficie de 35 km².

III -Consistance du Projet

Les travaux de réhabilitation du CSCOM consistent à:

- Installation et replis de chantier y compris toutes suggestions (évacuation des gravas);
- Démolition : Béton,dépose du plafonnage, dépose de la toiture, décapage de la chape existante ;
- Bétons maçonneries en élévation :Correction de toutes les fissures
- Enduit revêtements :Carreaux pour sol,carreaux de faïence,étanchéité sur chéneau ;
- Charpente couverture :F.P tôles ondulées galvanisées 7kg200 y compris toutes sujétions, F.P panne en IPN 120 sur les poteaux en béton armé y compris fixation et peinture et anti rouille toutes sujétions, F.P panne en IPN 80 sur les poteaux en béton armé y compris fixation et peinture et anti rouille toutes sujétions, F.P de traverses en cornier 50 normalise solidarisé par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture anti rouille, F.P de faux plafond en contreplaqué de 5 mm (carreaux de 50X50 poser sur travures métalliques);
- Menuiseries :Dressage et renforcement de toutes les menuiseries (portes et fenêtres) y compris toutes sujétions ;
- Menuiseries et aménagement de la cour :F.P de portes métal pleine de 80X220 en tôles noire d'épaisseur 10/10 ème y compris peinture anti rouille crochets, cales de maintien importés de scellement longueur minimum 20 cm et serrures de sureté de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double,Dallage cour ;
- Peinture : F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes surfaces extérieures, F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes surfaces

intérieures, peinture FOM sur faux plafond y compris toutes sujétions, F.P de peinture à huile types REX agro sur menuiseries et charpentes, peintures à huile sur murs intérieurs H=1.60m y compris toutes sujétions, grattages de l'ensemble des murs extérieurs et intérieurs.

IV-Données du marché et financement

L'entreprise titulaire du marché est l'Entreprise **Mansa souleymane SAMAKE** pour un montant de sept million cinq cent soixante un mille francs CFA (**7 561 000 FCFA**).

Le maître d'ouvrage : Action Mopti

Le bénéficiaire : CSCOM de Diambacourou

Le financement est assuré par : AFD

Délai d'exécution des travaux : 45 jours

Le suivi et contrôle des travaux : Action Mopti

V-Etats de réalisation des travaux

A la date du 15 avril 2017, l'ensemble des travaux prévus ont été réalisés à savoir :

N°	Désignation des travaux	Taux de réalisation
	TRAVAUX DE REHABILITATION	
I	INSTALLATION	
1.1	Installation et replis de chantier y compris toutes suggestions (évacuation des gravas)	100%
II	DEMOLITION	
2.1	Béton	100%
2.2	Dépose du plafonnage	100%
2.3	Dépose de la toiture	100%
2.4	Décapage de la chape existante	100%
III	BETONS MACONERIES EN ELEVATION	
3.1	Correction de toutes les fissures	100%
IV	ENDUIT REVETEMENTS	
4.1	Carreaux pour sol	100%
4.2	Carreaux de faïence	100%
4.3	Etanchéité sur chéneau	100%
V	CHARPENTE COUVERTURE	
5.1	F.P tôles ondulées galvanisées 7kg200 y compris toutes sujétions	100%

5.2	F.P panne en IPN 120 sur les poteaux en béton armé y compris fixation et peinture et anti rouille toutes sujétions	100%
5.3	F.P panne en IPN 80 sur les poteaux en béton armé y compris fixation et peinture et anti rouille toutes sujétions	100%
5.4	F.P de traverses en cornier 50 normalise solidarisé par boulonnage à l'aide d'équerre y compris peinture anti rouille	100%
5.5	F.P de faux plafond en contreplaqué de 5 mm (carreaux de 50X50 poser sur travures métalliques)	100%
VI	MENUISERIES	
6.1	Dressage et renforcement de toutes les menuiseries (portes et fenêtres) y compris toutes sujétions	100%
VII	MENUISERIES ET AMENAGEMENT DE LA COUR	
7.1	F.P de portes métal pleine de 80X220 en tôles noire d'épaisseur 10/10 ème y compris peinture anti rouille crochets, cales de maintien importés de scellement longueur minimum 20 cm et serrures de sureté de type vachette, fer plat de renfort avec cadre en double	100%
7.2	Dallage cour	100%
VIII	PEINTURE	
8.1	F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes surfaces extérieures	100%
8.2	F.P de peinture FOM appliqué en 2 couches sur toutes surfaces intérieures	100%
8.3	Peinture FOM sur faux plafond y compris toutes sujétions	100%
8.4	F.P de peinture à huile types REX agro sur menuiseries et charpentes	100%
8.5	Peintures à huile sur murs intérieurs H=1.60m y compris toutes sujétions	100%
8.6	Grattages de l'ensemble des murs extérieurs et intérieurs	100%

VI-Situation financière du projet

Montant du Marché	: 7 561 000 FCFA
Décaissement 1	: 3 024 400 FCFA
Cumul décaissement à la date du 15/04/2017	: 3 024 400 F CFA
Reste à payer	: 4 536 600 FCFA
Travaux réalisés	: 100 %

VII-Personnel mobilisé

Le personnel mobilisé par l'entreprise est composé de :

- Un (01) technicien de bâtiment chef de chantier
- Un chef maçon qualifié comme chef d'équipe maçon
- Un chef menuisier
- Un chef de la peinture
- Deux (02) ouvriers qualifiés (maçonnerie)
- Deux (02) ouvriers qualifiés (menuiserie)
- Deux (02) ouvriers qualifiés (peinture)

VIII-Matériel mobilisé

- Un camion bennes 7 m³
- Quatre (04) Brouettes
- Quatre (04) pelles
- Un lot de matériel maçon
- Un appareil de soudure
- Une bétonnière
- Un vibreur

Conclusion :

Nous pouvons affirmer avec certitude que tous les travaux prévus dans le cadre du présent marché ont été entièrement réalisés à notre satisfaction.

Ils contribueront sans doute à rendre à rendre agréable le cadre de travail des agents sanitaires du CSCOM et à améliorer j'en suis sûr la fréquentation du centre par les patients.

Il faut aussi signaler que ces travaux ont créé 10 emplois temporaires dont les détails figurent dans le tableau ci-dessous.

Tableau emploi homme/jours

Désignation	Nombre de personne	Nombre de jours
Un technicien de bâtiment chef de chantier	1	45 jours
Un chef maçon qualifié comme chef d'équipe maçon	1	45 jours
Un chef menuisier qualifié comme chef d'équipe menuisier	1	15 jours
Un chef de la peinture	1	10 jours
Ouvriers (maçons)	2	45 jours
Ouvriers (menuisiers)	2	15 jours
Ouvriers (peinture)	3	07 jours

ANNEXES

Vue Avant travaux



Vue Après travaux

